

RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA  
2022

# Seguimos Avanzando

TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA




**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

## EJE4: Un nuevo comienzo con mejores condiciones

### 3. Infraestructura física que dinamiza el desarrollo económico

INFRAESTRUCTURA



# INDICADOR DE RESULTADO: REDES VIALES EN BUEN ESTADO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD TERRESTRE EN EL ARCHIPIÉLAGO

Descripción meta producto	Indicador de producto	Valor esperado 2022	Valor ejecutado 2022
Mantener, mejorar o rehabilitar el sistema vial de transporte de la isla.	Km de vía mejorada	1,5	0,40
Rehabilitar el sistema vial de transporte de la isla	Km de vía con mantenimiento periódico	4	4,3 3 (2020) 1,3 (2021) 0,96 (2022)
Rehabilitar el sistema vial de transporte de la isla	Km de vías nuevas construidas	1	0,40



# INDICADOR DE RESULTADO: REDES VIALES EN BUEN ESTADO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD TERRESTRE

Descripción meta producto	Indicador de producto	Valor esperado 2022	Valor ejecutado 2022
Construir, mantener y rehabilitar redes de alcantarillado pluvial	Redes de drenaje pluvial con mantenimiento periódico	12000	<b>23108</b> 6000/20 6000/21 11108/22
Construir, mantener y rehabilitar redes de alcantarillado pluvial	Redes de drenajes pluvial rehabilitadas, construidos y/o ampliados	1300	<b>0</b>
Construir y mejorar andenes	Andenes construidos y/o Mejorados	3800	<b>0</b>



# INDICADOR DE RESULTADO: REDES VIALES EN BUEN ESTADO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD TERRESTRE

Descripción meta producto	Indicador de producto	Valor esperado 2022	Valor ejecutado 2022
Aeropuerto mejorado	Aeropuerto mejorado	0	NA
Vías de acceso en funcionamiento	Canales de acceso en funcionamiento	1	1
Realizar seguimiento y control a concesiones portuarias	Informes de seguimiento y control realizados	1	1



# ESTADO DE VÍAS RURALES P.V

Con Recursos del sistema general de Regalías

Objeto: Construcción en concreto rígido de vías rurales priorizadas en el plan vial en los sectores de Pepper Hill , Four Conner, Orange Hill y Duppy Gully en el archipiélago de San Andres , Providencia y Santa Catalina.

**Valor:** 31,074,000,601

AVANCE: 38% de ejecución

EN EJECUCION  
Contrato de Obra  
CONSORCIO PAVIMENTO  
SAN ANDRES  
Interventoría  
Consortio Vial SAI



# PROYECTO DE VÍAS RURALES DE SAN ANDRÉS

## *Pavimentación de la vía Pepper Hill*



RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022  
**Seguimos Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE VÍAS DE RURALES DE SAN ANDRES

## *Pavimentación de la vía Pepper Hill*



# PROYECTO DE VÍAS RURALES DE SAN ANDRÉS

*Compactación de la vía Four Corner*



RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA  
2022

**Seguimos  
Avanzando**

TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE VÍAS DE RURALES DE SAN ANDRES

*Vaciado en concreto de la vía Four Corner*



RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022  
**Seguimos Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE VÍAS DE RURALES DE SAN ANDRES

## *Pavimentación de la vía Orange Hill*




RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando** 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina


# PROYECTO DE VÍAS DE RURALES DE SAN ANDRES

## *Propuesta para intervención en duppy gully*

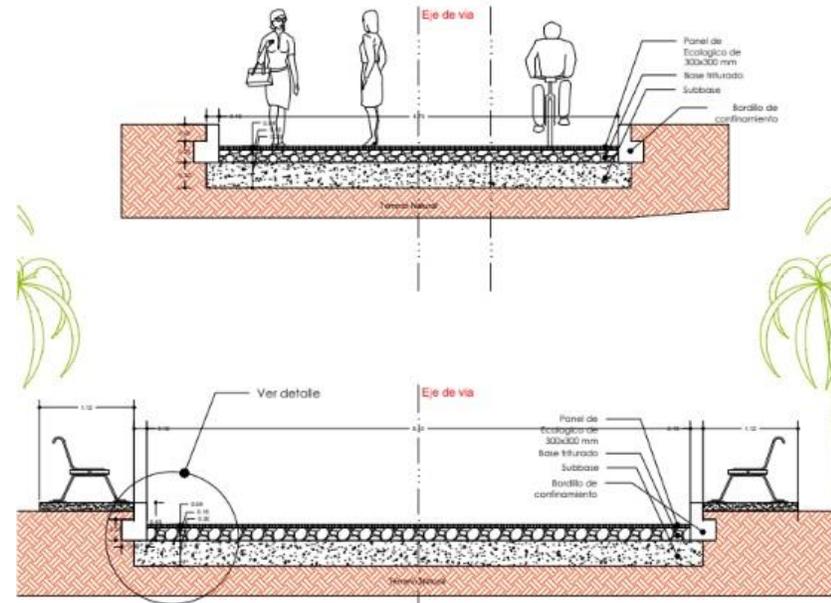

# PROYECTO DE VÍAS DE RURALES DE SAN ANDRES

*Propuesta para intervención en duppy gully*

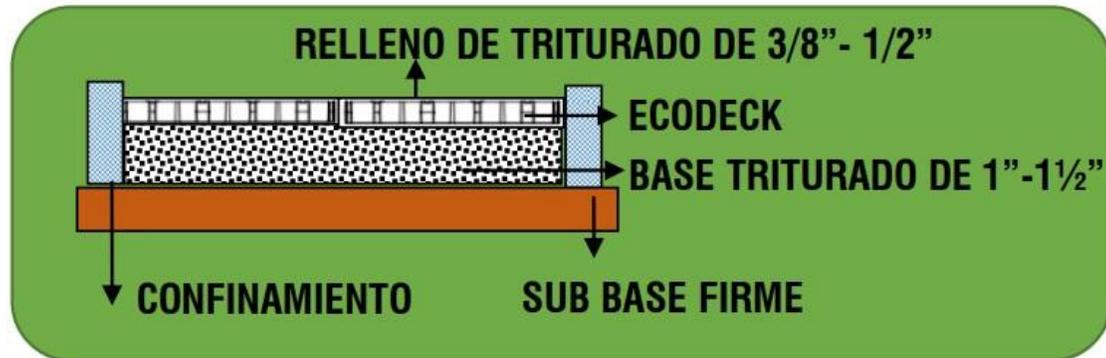

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022  
**Seguimos Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTO DE TAPAS Y REJILLAS

**Obra de rehabilitación de tapas y rejillas de drenajes pluviales**

BARKELL SERVICIOS SAS  
VALOR: \$ 296.306.120  
EJECUTADO/ LIQUIDADADO



RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE TAPAS Y REJILLAS

Obra de rehabilitación de estación de bombeo en la zona aledaña al  
Aeropuerto

JULIO DE AVILA

VALOR: \$ 54.658.182

EJECUTADO/ LIQUIDADADO



RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA 2022 DE LA GOBERNACIÓN

EJECUCIÓN AÑO 2022				
1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	
56,61%	62,85%	67,15%	74,45%	GOBERNACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022  
**Seguimos Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



# PROYECTOS QUE INICIARON SU EJECUCIÓN EN 2023

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTO DE LA CARRERA 13

- Primera (1) Etapa del proyecto

**Objeto:** Mejoramiento y construcción en concreto rígido de vías urbanas (tramo carrera 13, calle 8, 9 y tramo de la transversal 10a), en la Isla de San Andrés, departamento archipiélago de San Andrés, providencia y santa catalina.

**Valor:** 25,147,114,601

CONTRATISTA - ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE - AREMCA

EN EJECUCION





ANTES



DURANTE



DESPUES

CONTRATISTA

G4 SAN ANDRES

INTERVENTORIA

ASOMUCORDOBA

AVANCE: 1,97%



GOBERNACIÓN  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina



RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE LA CARRERA 13

- Segunda (2) Etapa del proyecto

**Objeto:** Mejoramiento y rehabilitación de carrera 13, avenida loma barrack y avenida colon de la isla de san Andres, priorizadas en el plan vial del departamento San Andrés y Providencia.

**Valor:** \$67.055.258.040

CONTRATISTA - ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE - AREMCA

EN EJECUCION



RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando** 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEGUNDA ETAPA CARRERA 13



**CONTRATISTA**

**CONSORCIO PLAN VIAL  
2022**

**INTERVENTORIA**

**ASOMURA**

**AVANCE: 5,77%**

RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA  
2022

**Seguimos  
Avanzando**

TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEGUNDA ETAPA CARRERA 13



RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022  
**Seguimos Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL LOTE 1 Y 2

## RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DE SAN ANDRÉS ISLA MEDIANTE LA MODALIDAD DE LOTES.

**Contratista:** LOTE 1 CONSORCIO ARCHIPIÉLAGO

LOTE 2 CONSORCIO GPN1

**Interventoría:** CONSORCIO INTERVENTORIAS VIAS PRIORIZADAS

**Valor del contrato:**  
27.000.000.000

		Sector	Nomenclatura	Longitud
Licitación pública No. 013 del 2.022 Valor: 27.291.334.533 COP	Consortio Archipiélago	Corales	Calle 33	180,00
			Calle 34	168,00
			Carrera 14B	65,00
			Carrera 14C	75,50
			Carrera 15	83,00
		Black Dog	Carrera 8A	300,00
		Sarie Bay	Calle 4	675,00
			Carrera 16	285,00
			Carrera 18	175,00
	Centro	Carrera 5B	208,00	
	Consortio GPN 1	Cabañas (Lote 2)	Calle 10	384,00
		Avenida Colón (Lote 2)	Calle 2	330,00
			Duarte Blum	289,00
			Vía	3.217,50

Ejecución: 35%



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando** 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

## LOS CORALES (etapa 1)




**ANTES**



**DURANTE**



**PROPUESTA**

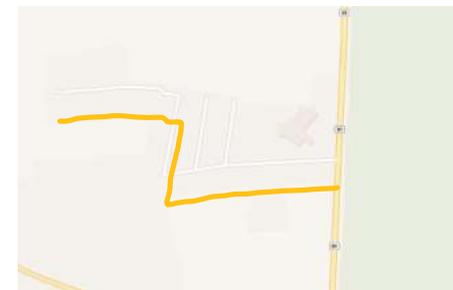

**Vía de dos calzadas con  
circulación en ambos  
sentidos.**

**Longitud de tramo: 380m  
Ancho prom. Vía: 4,50m  
Ancho prom. Andén: 1m**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**AVANCES 21%**

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos**  
**Avanzando**  
2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

## BLACK DOG



**ANTES**



**EN EJECUCION**



**DESPUES**



**Vía de dos calzadas con  
circulación en ambos  
sentidos.**

**Longitud de tramo: 300m  
Ancho prom. Vía: 4,20m  
Ancho prom. Andén: 1m**

**AVANCE 98 %**



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

## SARIE BAY CALLE 4




**ANTES**



**EJECUCIÓN**



**PROPUESTA**

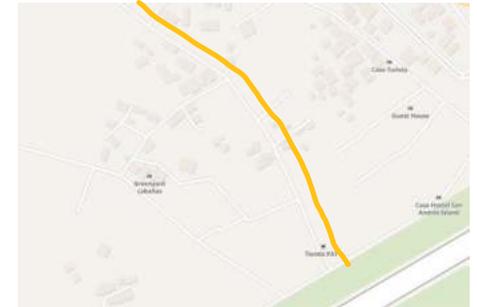

**Vía de dos calzadas con  
circulación en ambos  
sentidos.**

**Longitud de tramo: 682m  
Ancho prom. de vía: 6m  
Ancho prom. andén: 1,20m**

**AVANCES : 10%**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**POR INICIAR**



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# BOULEVAR



**ANTES**



**EJECUCIÓN**



**DESPUES**


RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022  
**Seguimos Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# CABAÑAS



RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando** 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# SAN FRANCISCO

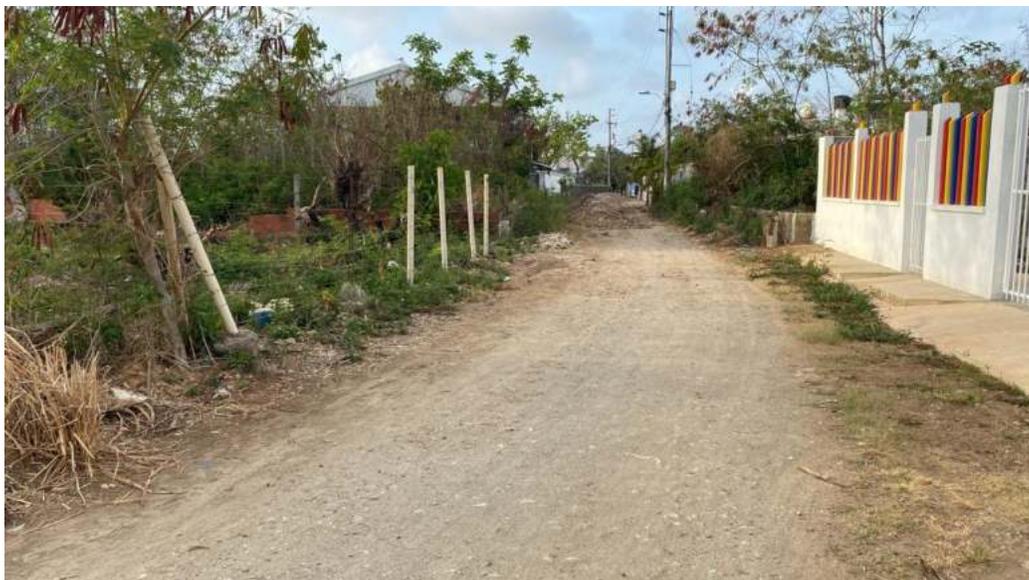

**ANTES**



**EJECUCIÓN**

RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA  
2022

**Seguimos  
Avanzando**

TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina


## SARIE BAY CARRERA 16



**ACTUAL**



**PROPUESTA**

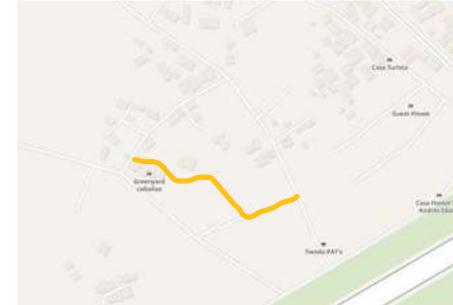

**Vía de una calzada.**

**Longitud de tramo: 230m**

**Ancho prom. Via: 4m**

**Ancho prom. Anden: 1m**

**Avances : Reajustes de  
diseños fase 1 culminado,  
obra por iniciar .**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**POR INICIAR**



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

## SARIE BAY CARRERA 18



**ACTUAL**



**PROPUESTA**



**Vía de dos calzadas con  
circulación en ambos  
sentidos.**

**Longitud de tramo: 230m  
Ancho prom. Vía: 6m  
Ancho prom. Anden: 1m**

**Avance : Reajustes de  
Diseños elaborado**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**POR INICIAR**



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO


## CARRERA 5B (Inpescar)



**ACTUAL**



**PROPUESTA**

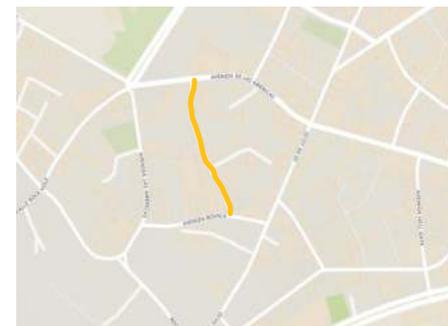

**Vía de una sola calzada**

**Longitud de tramo: 196m**

**Ancho prom. Via: 4m**

**Ancho prom. Anden: 1,1m**

**Avances : Reajuste de estudios Terminados ,  
Obra por iniciar**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**


**POR INICIAR**

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina


## CABAÑAS CALLE 10

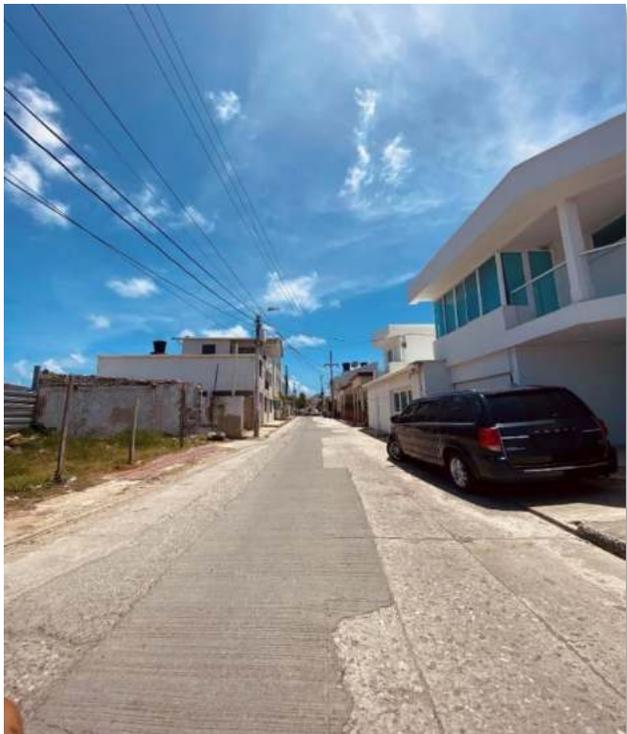

**ACTUAL**



**PROPUESTA**

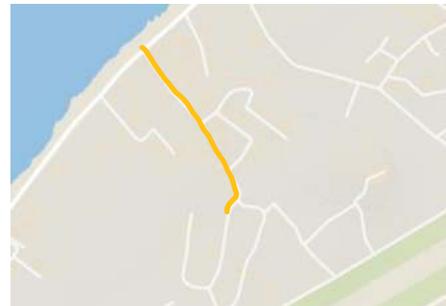

**Vía de dos calzadas con circulación en un ambos sentidos.**

**Longitud de tramo: 380m  
Ancho prom. Via: 4.50m  
Ancho prom. Anden: 1m**

**Avances : Reajustes Fase 1 culminando , Obra por iniciar**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS  
POR INICIAR**

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando**  
2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

## Av. COLÓN (tramo 2)



**ACTUAL**



**PROPUESTA**



**Vía de dos calzadas con  
circulación en un solo  
sentido.**

**Longitud de tramo: 338m  
Ancho prom. Via: 8m  
Ancho prom. Anden: 2,20m**

**AVANCES: Ajustes y  
estudios por finalizar**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**POR INICIAR**

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos  
Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE REHABILITACIÓN VÍA RECURSOS SOBRETASA A LA GASOLINA

REHABILITACIÓN VÍA PRINCIPAL EN LA LOMA (ETAPA 3 -TRAMO COVE 2 Y ETAPA 4), MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS RURALES PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL (ELSY BAR TRAMO 2 Y 3) Y REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN VARIOS TRAMOS DE SAN ANDRÉS ISLAS"

Contratista: CONSORCIO MEJORAMIENTO 2022

Interventoría: CONSORCIO BLUE ISLAND

EJECUCION: 24%

	Sector	Nomenclatura	Longitud
LP No.: 015 del 2.022 Valor: 18.914.728.771 COP Consortio Mejoramiento 2.022	La Loma	Vía	800,00
	Avenida Las Americas	Andenes	553,00
	Carrera 2	Andenes	643,48
	Avenida Atlántico	Andenes	207,10
	Avenida Newball	Andenes	400,18
	Punta Hansa	Andenes	257,30
	Elsy Bar - Tramo 2	Vía	1.250,00
	Vía		2.050,00
	Andenes		2.061,06

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022  
**Seguimos Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

## LOMA (etapa 3, tramo Cove 2, etapa 4)



**ACTUAL**



**PROPUESTA**



**Vías de dos calzadas con circulación en un ambos sentidos.**

**Longitud de tramos: 1067m  
Ancho prom. Via: 5.7m  
Ancho prom. Anden: 1m**

**AVANCES: Presliminares, Socializada y Organizando logística para inicio de obra**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**POR INICIAR / SOCIALIZADO**

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando** 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

## ELSY BAR (etapa 1, Tramo 2)



FOTO AVANCES

**Vías de dos calzadas con circulación en un ambos sentidos.**

**Longitud de tramos: 1027m  
Ancho prom. Via: 6,20m  
Ancho prom. Anden: 1m**

**AVANCES:Obra en ejecución 84%**

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando**  
2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

## ANDENES AV. LAS AMERICAS, AV. NEWBALL, PUNTA HANSA



Av. Las Americas

PROPUESTA

**Andenes 3n ambas  
calsadas .**

**Longitud de tramos:  
2,061m**

**Ancho prom. Anden: 2,50m**

**AVANCES: Preliminares,  
Socializada y Organizando  
logística para inicio de  
obra**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos  
Avanzando**  
2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MATENIMIENTO DE VÍAS EN BARRIOS Y SECTORES LEGALIZADOS

## RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MATENIMIENTO DE VÍAS EN BARRIOS Y SECTORES LEGALIZADOS EN VIGENCIA 2.022 PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

**Consorcio:** MTTTO SAN ANDRES 2022

**Interventoría:** CONSORCIO INTERVENTORÍAS VÍAS SAN ANDRES

**Ejecución:** 0%

		Sector	Nomenclatura	Longitud		
Licitación pública No.: 019 del 2.022 Valor: 21.936.971.751,29 COP	Consortio MTTTO San Andrés 2.022	Casa Harb	Calle 20	230,00		
			Calle 21	120,00		
			Carrera 19	56,00		
			Carrera 18	55,00		
		Cabañas	Calle 8 - Tramo I	150,00		
			Calle 9 - Tramo I	70,00		
			Carrera 19	130,00		
			Calle 8 - Tramo II	50,00		
			Calle 9 - Tramo II	130,00		
			Calle 8a	140,00		
			Carrera 18b	80,00		
		San Francisco	Calle 14	240,00		
			Carrera 14a			
		Gaviotas	Calle 13	115,00		
			Carrera 4	121,00		
			Calle 1A	57,00		
			Calle 2A	85,00		
			Calle 3A	69,00		
		Sarie Bay - Boulevard	Carrera 18	72,00		
		Bailey Boat	Carrera 1B	179,00		
		Ciudad Paraiso		252,00		
					<b>Vía</b>	<b>2.401,00</b>

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando** 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO




**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

## LA ROCOSA CALLE 20 (tramo 1)



**ACTUAL**

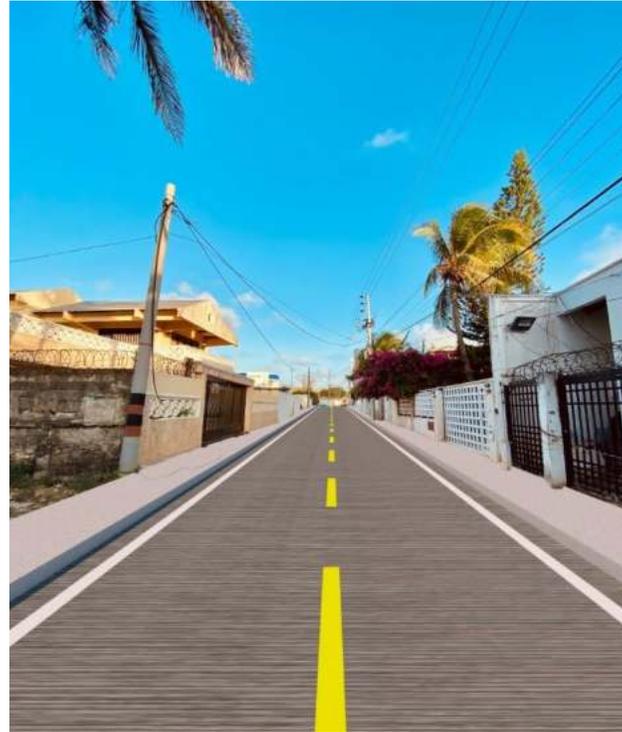

**PROPUESTA**



**Vía de dos calzadas con circulación en un ambos sentidos.**

**Longitud de tramo: 469m  
Ancho prom. Vía: 7m  
Ancho prom. Anden: 1,20m**

**Avances: Pendiente por iniciar**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**POR INICIAR**




**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

## CABAÑAS (Vías internas etapa 1)



**ACTUAL**

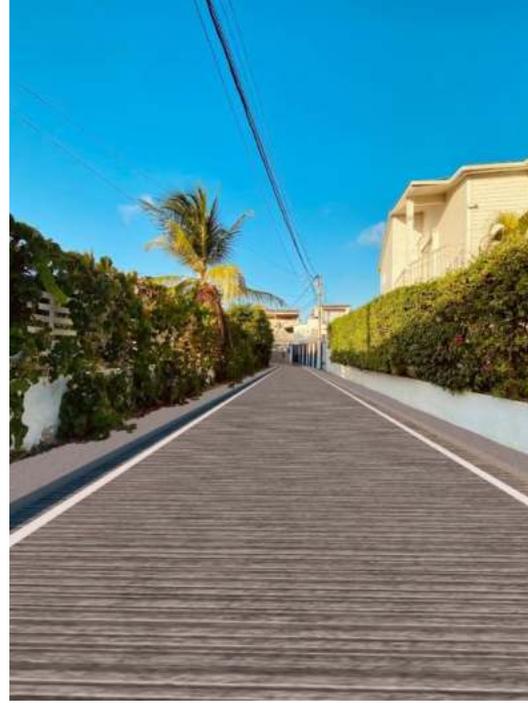

**PROPUESTA**



**Vías de una sola calzada.**

**Longitud de tramos: 536m**

**Ancho prom. Via: 4m**

**Ancho prom. Anden: 1m**

**Avances:  
Pendiente por  
iniciar**

RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA  
2022

**Seguimos  
Avanzando**

TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**

**POR INICIAR**



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

## CIUDAD PARAISO



**ACTUAL**



**PROPUESTA**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
OBRAS PUBLICAS**

**POR INICIAR**

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE PEATONAL EN FREE TOWN

**OBRA REHABILITACION, CONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA USO Y TRANSITO PEATONAL EN FREE TOWN, GENNY BAY Y SPRATH BIGHT INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS**

UNIÓN TEMPORAL SAI  
PEATONAL 2022

VALOR: \$ 8.985.025.060

CO1.PCCNTR.4355941



ANTES



EJECUCIÓN



PROPUESTA

INTERVENTORIA  
UNION TEMPORAL SAI 2023  
21 Marzo 2023

EN EJECUCIÓN

AVANCE: 8%



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando** 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTOS EN APOYO DE LAS METAS MISIONALES DE OTRAS DEPENDENCIAS

Mediante el decreto 0174 del 11 de abril del 2022 por medio del cual se delega la ordenación del gasto y las competencias para la celebración de los contratos de obras públicas y las consultorías previas y de ejecución a los mismos del secretario de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTO DEL BARCO

**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL MONUMENTO BARCO UBICADO  
FRENTE AL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE LA ISLA DE SAN  
ANDRÉS ISLA**

CONTRATISTA:  
CONSORCIO MTTO BARCO

VALOR: \$ 457.038.467

EJECUTADO/ LIQUIDADADO

CO1.PCCNTR.4101013



ANTES



DESPUES

RENDICIÓN DE CUENTAS  
**Seguimos**  
**Avanzando**  
VIGENCIA  
2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTO MISION CRISTIANA

**OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA I. E. MISIÓN CRISTIANA  
– SEDE CENTRO, EN SAN ANDRÉS ISLA.**

UNIÓN TEMPORAL JUAL

VALOR: \$ 791.531.450

AVANCE:52%

**CO1.PCCNTR.3640871**

INTERVENTORIA  
CONSORCIO  
CENTRO CRISTIANA



ANTES



EJECUCIÓN

Observacion : Suspendida hasta 10 Abril

RENDICIÓN DE CUENTAS  
**Seguimos**  
**Avanzando**  
VIGENCIA 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO


# PROYECTO LUDOTECA

**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL Y OBRAS DE URBANISMO PARA LA I. E. PHILLIP BEACKMAN, EN SAN ANDRÉS ISLA.**

WILMER JARAMILLO  
VALOR: \$ 890.594.900  
AVANCE: 100%

**CO1.PCCNTR.3589060**

INTERVENTORIA  
CONSORCIO LUDOTECA  
NAVES

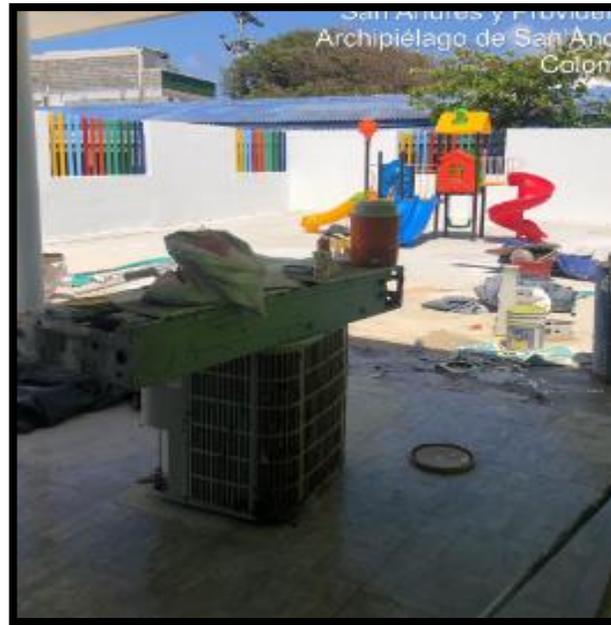

EJECUCIÓN



ENTREGADO

RENDICIÓN DE CUENTAS  
**Seguimos Avanzando**  
VIGENCIA 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTO PHILLIP BEACKMAN

**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL Y OBRAS DE URBANISMO PARA LA I. E. PHILLIP BEACKMAN, EN SAN ANDRÉS ISLA.**

WILMER JARAMILLO

VALOR: \$ 1.062.843.909

AVANCE: 88%

CO1.PCCNTR.3589060

INTERVENTORIA  
CONSORCIO INTERVENTORIA  
PHILIP BEACKMAN



ANTES



EJECUCIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS  
**Seguimos Avanzando**  
VIGENCIA 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

**RESTAURACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS  
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES DE LA ASAMBLEA Y GOBIERNO DE  
SAN ANDRES ISLAS**

CONSORCIO RESTAURACION SAI

VALOR: \$ 8.529.218.191

AVANCE: 48,0%

**CO1.PCCNTR. 3998643**

INTERVENTORIA  
CONSORCIO EDIFICACIONES  
SAN ANDRES



EJECUCIÓN



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos** 2022  
**Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTO ADECUACION CENTRO DE SALUD MENTAL

**CONTRATAR LA ADECUACION DE ESPACIOS DE CENTRO DE SALUD MENTAL EN EL CENTRO DE SALUD LA LOMA**


CONSORCIO INGENIERIA SALUD SAI

VALOR: \$ 648,000.700

AVANCE: 18,09%

**CO1.PCCNTR. 47896333**

SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

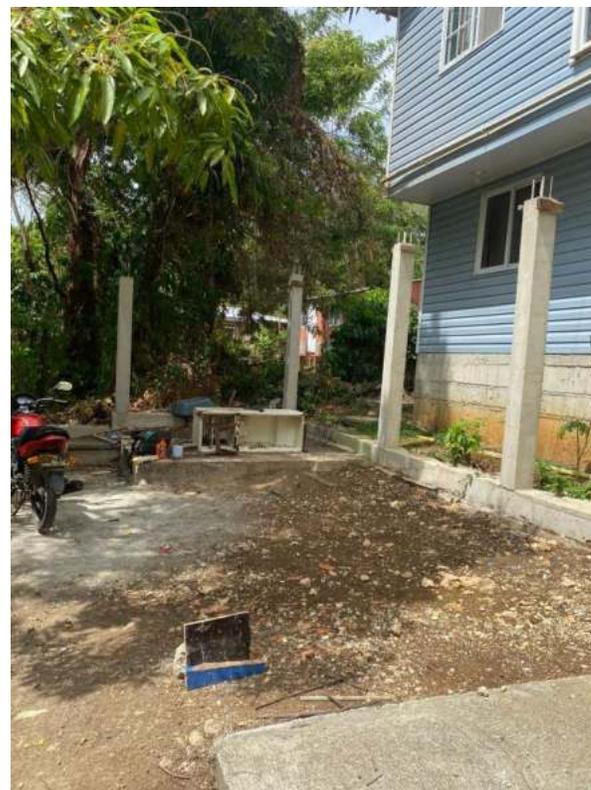

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos Avanzando** 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

# PROYECTO DE CEMENTERIO


**OBRA REHABILITACION, CONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA USO Y TRANSITO PEATONAL EN FREE TOWN, GENNY BAY Y SPRATH BIGHT INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS**

**Contratista:** ARARAT  
(asociación regional de la región atlántico)

VALOR: \$ 8.985.025.060

AVANCE: 35%

CO1.PCCNTR.4355941

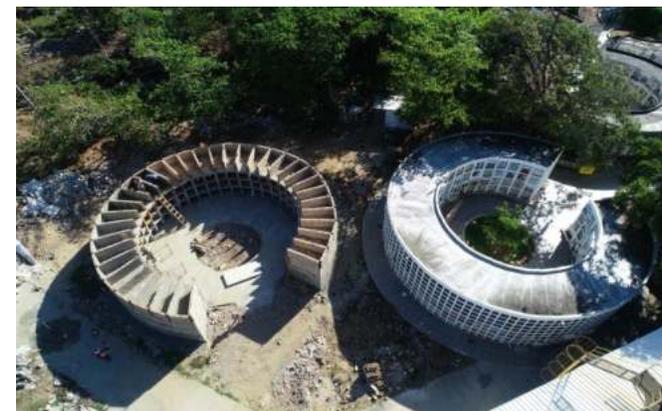

EJECUCIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022  
**Seguimos Avanzando**  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTO DE CENTRO HIPICO



CONVENIO CON FONDO MIXTO DE DEPORTES DEL VALLE POR 29.000.000.000

Fase 1; Adjudicado y Contratado estudios y diseños, avance, 98%

fase 2; obras construcción, espera a finalización de la fase 1 y obtención de licencia

# PROYECTO DE CAYO HAYNS CAY

**Contrato  
interadministrativo:  
AREMCA**

Valor: 11.300.000

Contratista:

Interventoria:



EN EJECUCION



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA  
**Seguimos  
Avanzando** 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTO DE ESTUDIO Y DISEÑOS ESTADIO DE SOFTBOL

**ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE  
ACTUALIZACIÓN DEL ESTADIO DE SOFTBALL DEL DEPARTAMENTO  
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.**

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR: \$ 678.541.556

AVANCE: 100%

LIQUIDADO

**CO1.PCCNTR. 4168172**

El proyecto se presentara ante regalías, esta en tramite en planeación para Revisión Aprobación.



RENDICIÓN DE CUENTAS  
**Seguimos Avanzando**  
VIGENCIA 2022  
TODOS POR UN NUEVO COMIENZO

# PROYECTO MURO DEL BOLIVARIANO

**REALIZAR LA DEMOLICIÓN LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL INSTITUTO EDUCATIVO BOLIVARIANO, EN SAN ANDRÉS, ISLAS**

CONSORCIO R&P SAI

VALOR: \$ 1.523.944.017

AVANCE: 0%

**CO1.PCCNTR. 4451831**

INTERVENTORIA EN PROCESO DE  
CONTRATACION



# PROYECTO DE PARQUES

PARQUES SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIAS					
ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
1,00	PARQUES SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIAS				
	DESCRIPCION	CANT	UND	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1.1	PARQUE SCHOOL HOUSE	UND	1,00	\$ 2.372.399.637,28	\$ 2.372.399.637,28
1.2	PARQUE LAS PALMAS	UND	1,00	\$ 822.848.944,97	\$ 822.848.944,97
1.3	PARQUE NATANIA	UND	1,00	\$ 1.076.808.461,26	\$ 1.076.808.461,26
1.4	PARQUE BARACK	UND	1,00	\$ 1.369.254.158,35	\$ 1.369.254.158,35
1.5	PARQUE CESAR GAVIRIA	UND	1,00	\$ 1.268.101.515,85	\$ 1.268.101.515,85
1.6	PARQUE SARIE BAY	UND	1,00	\$ 261.999.824,03	\$ 261.999.824,03
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 7.171.412.541,72</b>

RADICADA ANTE EL MINISTERIO EL DEPORTE PARA  
OBTENCION DE RECURSOS

# ¡GRACIAS!

TODOS POR UN NUEVO  
**COMIENZO**



**GOBERNACIÓN**  
Departamento Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina
